Neubau Stadthalle

Bauausführung

Asta CompetenceCenter

Nr.	Bezeichnung	Unternehmer	Start	Dauer	Ende
1	Baubeginn	Termine	03.03.2008		03.03.2008
2	Baustelleneinrichtung	Maulwurf	03.03.2008	5t	07.03.2008
3	**Erdarbeiten**	**Maulwurf**	**10.03.2008**	**5w 1t**	**16.04.2008**
4	Baugrubenaushub	Maulwurf	10.03.2008	3t	12.03.2008
5	Fundamente	Maulwurf	13.03.2008	8t	26.03.2008
6	Kanal	Maulwurf	27.03.2008	12t	11.04.2008
7	Grundung	Maulwurf	14.04.2008	3t	16.04.2008
8	**Stahlbetonarbeiten**	**Mauer & Fuge**	**17.04.2008**	**8w 2t**	**18.06.2008**
9	Montage Wände	Mauer & Fuge	17.04.2008	25t	02.06.2008
10	Montage Decken	Mauer & Fuge	02.05.2008	10t	09.06.2008
11	Aussparungen	Mauer & Fuge	10.06.2008	7t	18.06.2008
12	**Gerüst vorhalten**	**Stahlhuber**	**09.05.2008**	**14w 4t**	**22.08.2008**
13	Aufbau / Abbau	Stahlhuber	09.05.2008	5t	22.08.2008
14	**Dacharbeiten**	**Obenauf**	**19.06.2008**	**4w**	**16.07.2008**
15	Zimmermann	Obenauf	19.06.2008	10t	02.07.2008
16	Dachdecker	Obenauf	03.07.2008	10t	16.07.2008
17	Spengler	Obenauf	10.07.2008	5t	16.07.2008
18	**Fassade / Stahlbau**	**Stahlhuber**	**19.06.2008**	**18w 1t**	**24.10.2008**
19	Stahlbau Vordach	Stahlhuber	19.06.2008	5t	25.06.2008
20	Fassade	Stahlhuber	26.06.2008	40t	20.08.2008
21	Treppengeländer	Stahlhuber	16.10.2008	7t	24.10.2008
22	**Heizung / Sanitär**	**Röhrich**	**03.06.2008**	**28w**	**16.12.2008**
23	Heizung	Röhrich	03.06.2008	25t	16.12.2008
24	Sanitär	Röhrich	10.06.2008	25t	16.12.2008
25	**Elektro / Blitzschutz**	**Blitz & Co.**	**03.04.2008**	**36w**	**16.12.2008**
26	Blitzschutz	Blitz & Co.	03.04.2008	10t	23.07.2008
27	Vormontage Wände	Blitz & Co.	19.06.2008	20t	16.07.2008
28	Vormontage Kanäle	Blitz & Co.	26.06.2008	15t	16.07.2008
29	Vormontage Decken	Blitz & Co.	03.07.2008	19t	29.07.2008
30	Endmontage	Blitz & Co.	03.12.2008	10t	16.12.2008
31	**Innenputz / Estrich**	**Plattenmeier**	**30.07.2008**	**5w 1t**	**03.09.2008**
32	Innenputz	Plattenmeier	30.07.2008	20t	26.08.2008
33	Estrich	Plattenmeier	27.08.2008	6t	03.09.2008
34	**Fliesenarbeiten**	**Plattenmeier**	**18.09.2008**	**6w 3t**	**04.11.2008**
35	Boden	Plattenmeier	18.09.2008	10t	01.10.2008
36	Treppen	Plattenmeier	02.10.2008	9t	15.10.2008
37	Wände	Plattenmeier	16.10.2008	11t	30.10.2008
38	Fensterbänke	Plattenmeier	31.10.2008	3t	04.11.2008
39	**Innenausbau**		**30.07.2008**	**21w 2t**	**09.01.2009**
40	Trockenbau	Plattenmeier	30.07.2008	17t	21.08.2008
41	Abgehängte Decken	Plattenmeier	31.10.2008	13t	18.11.2008
42	Maler	Pinsel	19.11.2008	20t	16.12.2008
43	Teppiche	Pinsel	03.12.2008	18t	09.01.2009
44	Endreinigung	Heinzelmänchen	12.01.2009	4t	15.01.2009
45	Früheste Abnahme	Termine	16.01.2009		16.01.2009

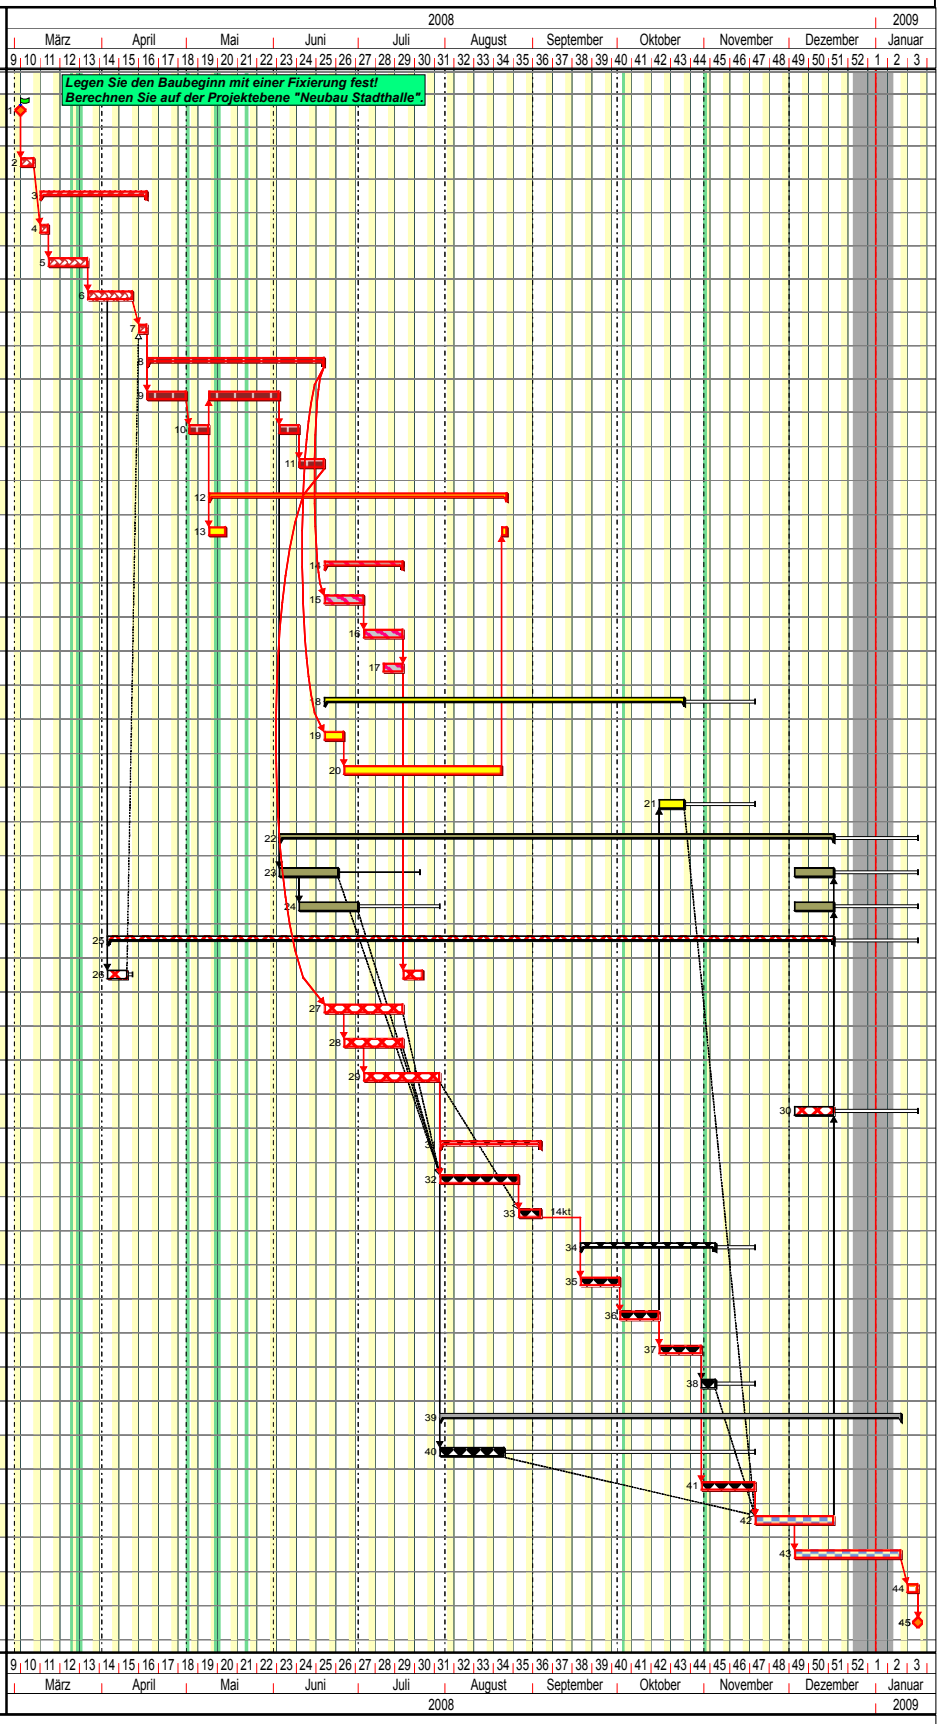

Unternehmer: Termine, Maulwurf, Mauer & Fuge, Stahlhuber, Obenauf, Röhrich, Blitz & Co., Plattenmeier, Pinsel, Heinzelmänchen

Verknüpfungstypen: Standard (K), Standard, Standard (R)

Plansymbole: Freier Puffer, Gesamtpuffer, Kritisch, Meilenstein, Startdatum
